계룡산 탐방안내소 전면개선공사(토목) 계획(안)

('26. 10., 탐방시설과)

◈ 탐방정보 제공 및 탐방프로그램 운영을 통한 국립공원의 다양한 기능 홍보, 탐방서비스 제공하고자 탐방안내소 주변 부지에 대하여 정비하고자 함

Ⅰ 사업 개요

❑ 사 업 명: 계룡산 탐방안내소 전면개선공사(토목)
❑ 사업위치: 충남 공주시 반포면 학봉리 777 일원
❑ 공 사 비: 금187,500,000원(금일억팔천칠백오십만원)
○ 도급공사비: 금137,580,000원(금일억삼천칠백오십팔만원)
○ 관급자재비: 금49,920,000원(금사천구백구십이만원)
❑ 기 간: 착수일로부터 28일간
❑ 사업내용: 탐방안내소 부대토목 공사 1식

Ⅱ 세부 공사 계획


❑ 세부 공사내용

구분	공종	규격	수량	단위
철거	아스콘포장깨기	T=120mm	240	㎡
	경계석 설치	180×180	67	m
	기존 플륨관 철거	300×30	66	m
	매쉬휀스 철거	H1.2m×W2.0m	62	m
	능형망 휀스 철거	H1.5m×W2.0m	40	m
폐기물	콘크리트		7.7	㎡
	아스콘		28.8	㎡
	운반및처리		83.9	ton
배수시설	집수정	600×600	5	개소
	빗물받이	400×500	7	개소
	이중벽PE관	ø300	83	m
		ø250	52	EA
	이중벽PE관 연결관	ø300	10	m
		ø250	3	EA
	플륨관	300×300	106	m
구조물	보강토블럭	0.7~3.3m	44	㎡
	경사데크	B1.5m×L32m	32	m
	철재난간	500×600×700	60	경간
	목재계단	B1.5m×L6.3m	6.3	m
	조경석쌓기	500×600×700	50	㎡
포장	아스콘포장	T=150mm	400	㎡
	쇄석부설	T=150mm	710	㎡

❑ 탐방안내소 부대토공사 계획



탐방안내소 주변 항공사진

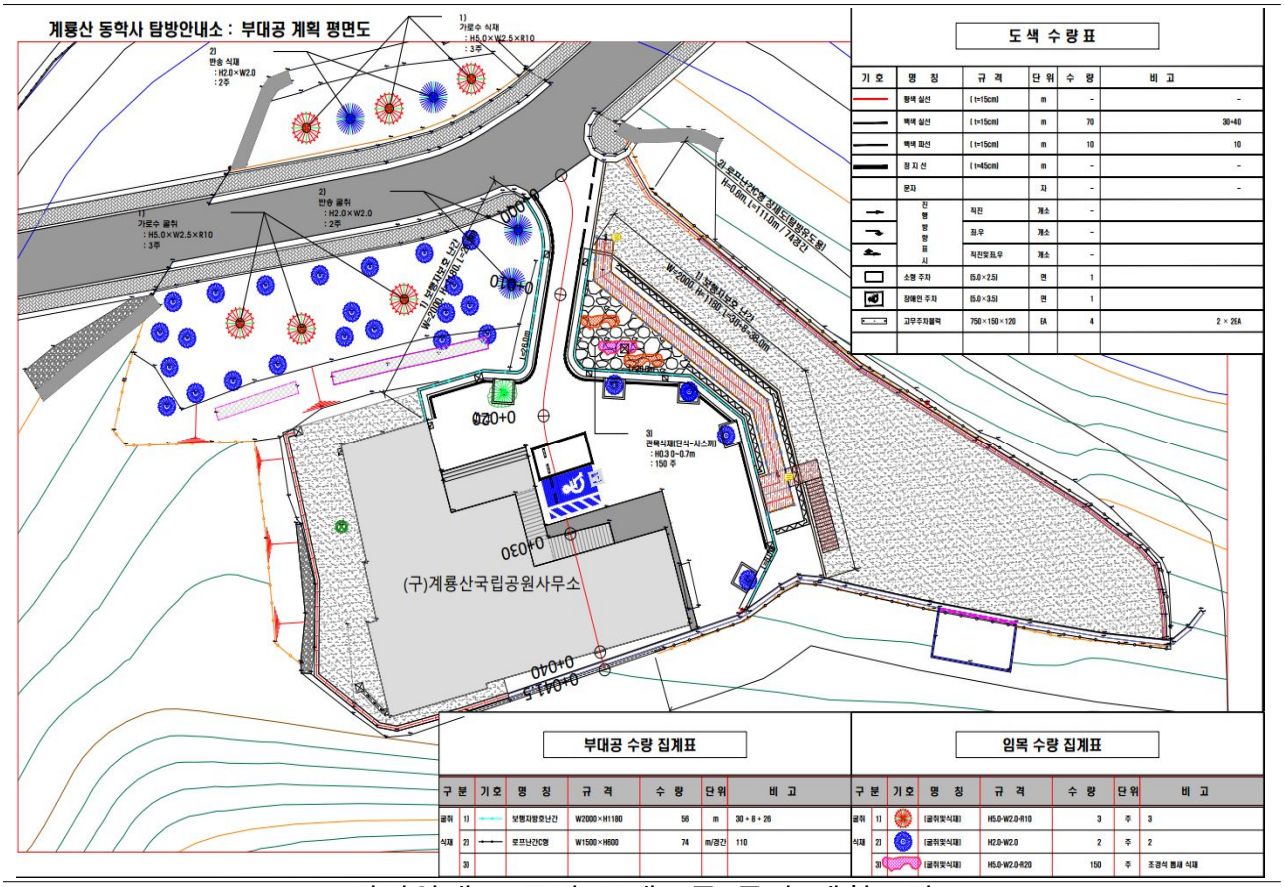

탐방안내소 주변 부대토목 공사 계획도면



공사내용	(포장) 아스콘, 쇄석 포장 (구조물) 데크경사로, 목재계단, 보강토옹벽, 안전난간 설치 (배수) 기존플륨관 철거 및 재설치 (철거) 휀스 철거



공사내용	(포장) 아스콘 포장 (구조물) 안전난간 설치



공사내용	(포장) 쇄석 포장 (배수) 집수정, 빗물받이, 이중벽관 설치



공사내용	(포장) 쇄석 포장 (배수) 집수정, 빗물받이, 이중벽관 설치

끝.
